
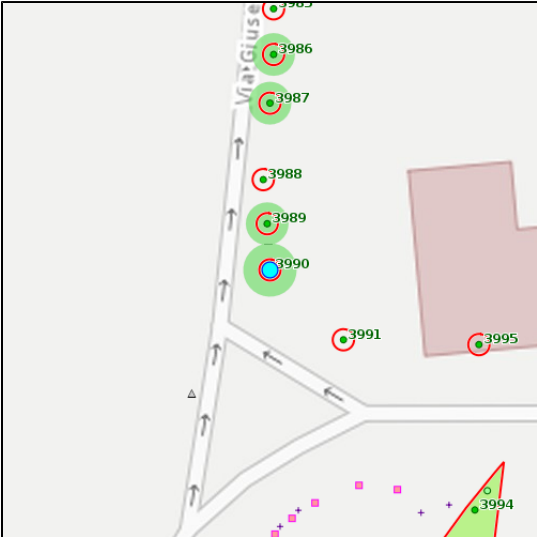


Nr. pianta 3990	Cartellino
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia <i>Tilia x vulgaris</i> (Tiglio ibrido europeo)	
Sito di crescita tornello con cordolo	
Fase fisiologica adulto	
Altezza 15-22 m	Ø chioma 5,00 m
Ø tronco 60 cm	Circ. tronco 189 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Stimato	Età pianta calcolata
Data stima	Età stimata
Note AI=tornello-inerbito FO=Impalcata D=filare semplice FF=5 - adulto V=sufficiente	

VTA - Data: 18/04/2019

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore Agro Service	
Tipo Primo controllo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita tornello con cordolo	
Stato vegetativo 6 - Normale	
Aspettative di vita Media	
Altezza 15-22 m	
Ø chioma 5,00 m	
Ø tronco 60 cm	
Circ. tronco 189 cm	
Note Pianta in filare monospecifico, con colletto allargato e ferita di lieve entità su contrafforte radicale lato strada. Fusto colonnare, provvisto di riscoppi vegetativi e chioma filata, costituita da branche primarie codominanti a sviluppo assurgente. L'indagine strumentale al colletto rileva cavità interna estesa in R2 ed R3, con t/R insufficiente (R2) e prossimo al limite (R3). Pianta compromessa dal punto di vista strutturale; un drastico intervento di contenimento della chioma, mirante alla riduzione dei carichi gravanti al colletto, risulterebbe	

VTA - Data: 18/04/2019		CPC: D - Gravità estrema						
tecnicamente errato. Pertanto, si suggerisce l'abbattimento.								
Anomalie: (1): difetto minore, (2): difetto medio, (3): difetto grave								
Colletto Allargato (2), Contrafforti lesionati (1)								
Tronco Riscoppi (2)								
Castello Branche codominanti (2)								
Branche Ferita (1), Filate/assurgenti (2)								
Chioma Asimmetria (1)								
Interferenze Ostacoli per competizione con altre piante (2), Sottoservizi (1)								
Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res. [cm]	t/R
1	18/04/2019	Colletto	90	10,00		77,67	21	0,54
2	18/04/2019	Colletto	180	10,00		77,67	6	0,15
3	18/04/2019	Colletto	270	10,00		77,67	12.5	0,32
Iter								
#	Data esecuzione	Eseguito da			Stato VTA			
1	18/04/2019 22:33:50	Agro Service			In lavorazione			
2	01/07/2019 17:45:22	Agro Service			Richiesta validazione			
3	01/07/2019 17:45:22	Agro Service			Validata			
